

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril a Junio

FECHA DE CORTE: 30/06/22

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



ITSON
Educar para
Trascender

Nombre: Instituto Tecnológico de Sonora

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo
Correo electrónico: nríos@itson.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo
Correo electrónico: rtamayo@itson.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio H, Unidad Obregón, Campus Centro.			X			\$ 12,000,000.00	\$ -		Cubiculo	23	166.00	Proceso de contratación de la obra por licitación pública, fallo programado para el día 08 de julio de 2022	Fallo, firma de contrato, pago de anticipo, inicio de la obra	GLOBAL DEL PROYECTO		Se tiene programado el inicio de la obra para el 18 de julio de 2022.							
							Oficinas	2	18.00															
							Sanitarios	2	22.00															
							Librería	1	114.00															
							Áreas comunes	3	411.00															
							Otros	2	215.00															
					TOTAL	33	946.00																	
2	Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.			X			\$ 5,742,628.00	\$ -		Aulas	9	537.60	Proceso de contratación de la obra por licitación pública, fallo programado para el día 13 de julio de 2022	Fallo, firma de contrato, pago de anticipo, inicio de la obra	GLOBAL DEL PROYECTO		Se tiene programado el inicio de la obra para el 25 de julio de 2022.							
							Sanitarios	2	60.75															
							Áreas comunes	1	142.70															
							Otros	1	84.95															
							TOTAL	13	826.00															
						\$17,742,628.00	\$0.00	\$0.00																

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril a Junio

FECHA DE CORTE: 30/06/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras del Edificio H, Unidad Obregón, Campus Centro.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

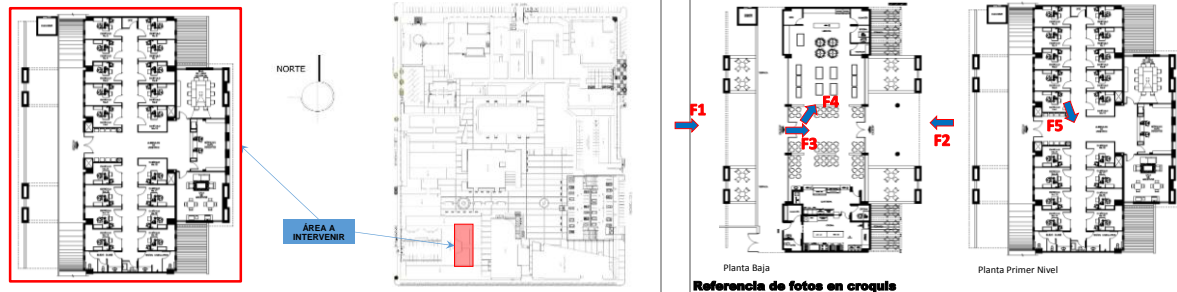

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

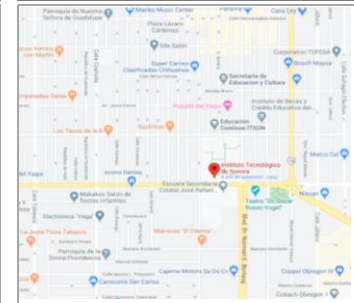

ITSON
Educar para Trascender

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Fachada Posterior

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Interior de laboratorio

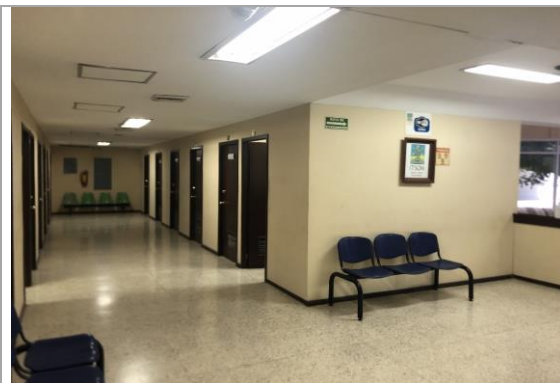


F4: Interior / Pasillo Sur



F5: Interior de laboratorio


Dr. Jesús Héctor Hernández López
- Rector


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional


Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril a Junio

FECHA DE CORTE: 30/06/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

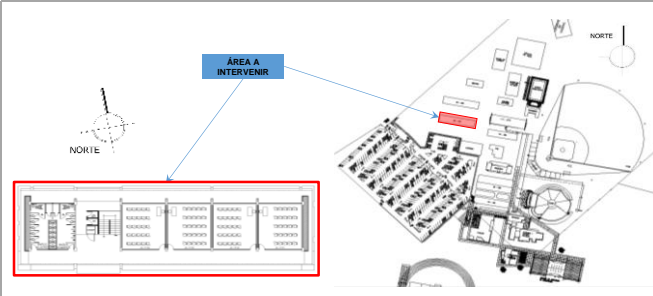

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



ITSON
Educador para Trascender

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Interior Aula Planta baja



F4: Interior Aula Planta Alta



F5: Pasillo Planta Alta

Comentarios de los trabajos realizados:

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
