

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Periodo reportado

Enero a Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/23

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



ITSON
Educar para
Trascender

Nombre: **Instituto Tecnológico de Sonora**

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo
Correo electrónico: nríos@itson.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo
Correo electrónico: rtamayo@itson.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio AG-200 de Servicios Académicos y Estudiantiles, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.			X			\$ 8,200,000.00	\$ -		Aulas	2	126.05							Los expedientes técnicos de los proyectos autorizados para el ejercicio 2023, se encuentran en proceso de elaboración e integración para ser entregados al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE).						
		Laboratorios	4	317.71																					
		Cubículos	18	189.06																					
		Sala de Maestros	1	35.62																					
		Áreas comunes	3	220.30																					
		Otros	3	37.03																					
TOTAL	31	925.77	GLOBAL DEL PROYECTO																						
2	Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-700, de Biotecnología y Tecnología de Alimentos Unidad Obregón, Campus Náinari.			X			\$ 8,800,000.00	\$ -		Laboratorios	7	537.65							Los expedientes técnicos de los proyectos autorizados para el ejercicio 2023, se encuentran en proceso de elaboración e integración para ser entregados al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE).						
		Cubículos	2	21.28																					
		Sanitarios	2	37.25																					
		Áreas comunes	2	257.54																					
		Otros	3	101.41																					
		TOTAL	16	955.13	GLOBAL DEL PROYECTO																				
3	Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-100, de Aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles, Unidad Navojoa, Campus Sur.			X			\$ 5,557,836.00	\$ -		Aulas	2	124.40							Los expedientes técnicos de los proyectos autorizados para el ejercicio 2023, se encuentran en proceso de elaboración e integración para ser entregados al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE).						
		Laboratorios	2	337.71																					
		Cubículos	17	206.08																					
		Sanitarios	2	7.24																					
		Áreas comunes	2	230.49																					
		TOTAL	25	905.92	GLOBAL DEL PROYECTO																				
						\$22,557,836.00	\$0.00	\$0.00																	

Dr. Jesús Hestor Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023

AÑO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Adecuaciones y Mejoras del Edificio AG-200 de Servicios Académicos y Estudiantiles, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.



Educación para Trascender

Porcentaje de avance


0%

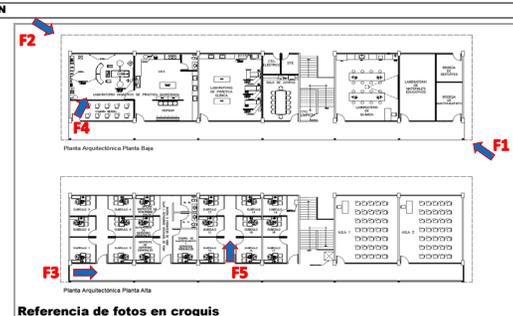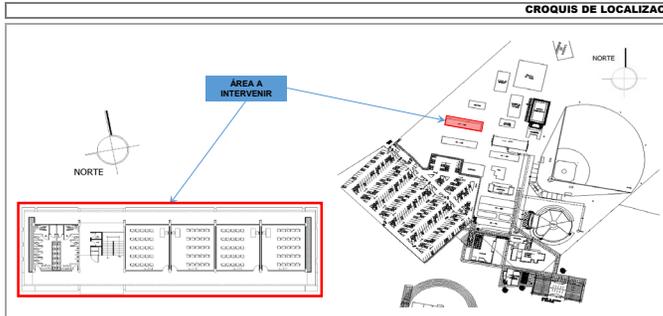

FOTOS



F1: Fachada principal

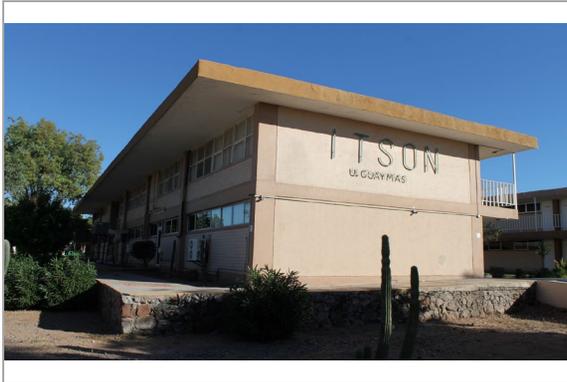

F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Pasillo Planta Alta



F4: Interior Laboratorio



F5: Cubículos

Dr. Jesús Alcívar Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Periodo reportado
Enero a Marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/23

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-700, de Biotecnología y Tecnología de Alimentos Unidad Obregón, Campus Nainari.**



ITSON
Educador para Trascender

Porcentaje de avance

0%

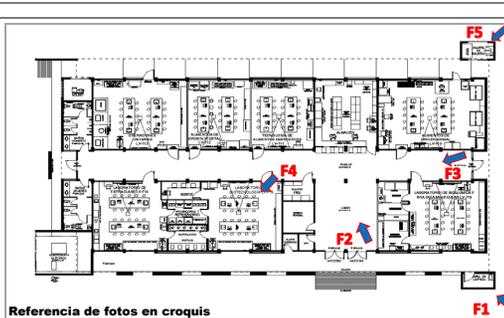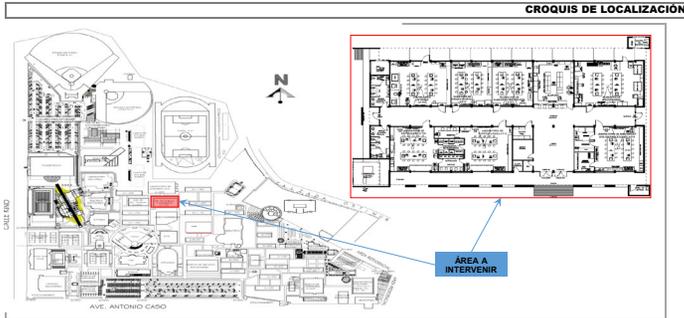

Referencia de fotos en croquis

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Fachada Posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

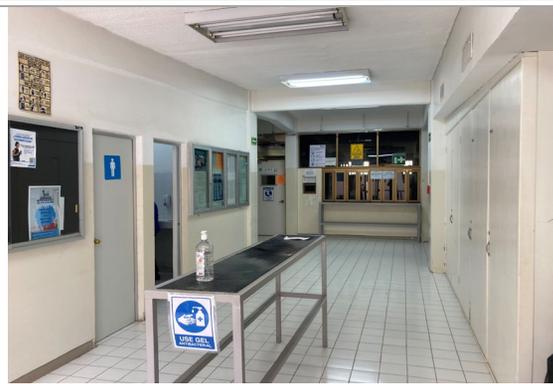

F3: Vestibulo de acceso



F4: Laboratorio LV-715



F5: Pasillo interior

Dr. Jesús Hernández López
Revisor

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Bedolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Periodo reportado
Enero a Marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/23



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-100, de Aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles, Unidad Navojoa, Campus Sur.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

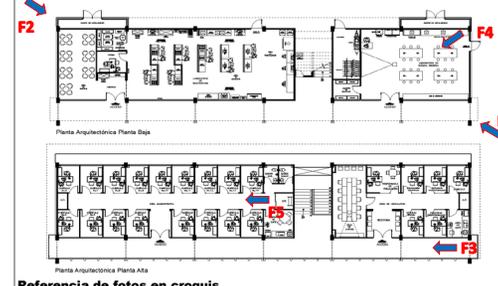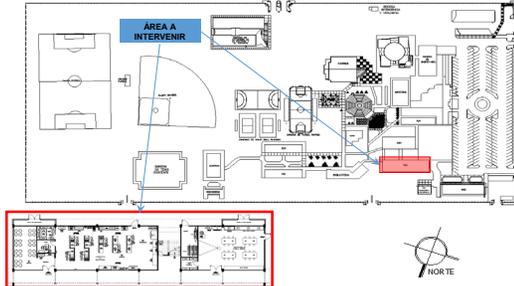

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



ITSON
Educador para Trascender

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Pasillo Planta Alta



F4: Interior Laboratorio



F5: Interior Cubículos

Dr. Jesús Hernández López
Rector

Dra. Nidia Johana Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
