

2021

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio

FECHA DE CORTE: 30/06/21

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



ITSON
Educar para Trascender

Nombre: **Instituto Tecnológico de Sonora**

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo
Correo electrónico: nríos@itson.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Luis Alonso Islas Escalante
Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo
Correo electrónico: lislas@itson.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Adecuaciones y Mejoras para el Edificio de Aulas A-200, Unidad Obregón Campus Centro.			X			\$ 11,000,000.00	\$ -		Aulas/salones	11	706.74						Actualmente se encuentran en proceso de contratación, por medio de licitación pública, el fallo se tiene programado para el día viernes 09 de julio de 2021, para dar inicio a la ejecución de la obra para el día lunes 19 de julio de 2021.						
						Oficinas				3	75.97													
						Sanitarios				3	80.28													
						Aula Magna				1	126.44													
						Laboratorios				5	431.75													
						Otros				16	733.22													
				TOTAL	39	2,154.40																		
2	Adecuaciones y Mejoras para el Laboratorio LV-200 de Veterinaria, Unidad Obregón Campus Nainari.			X			\$ 7,000,000.00	\$ -		Laboratorios	10	702.07						Actualmente se encuentran en proceso de contratación, por medio de licitación pública, el fallo se tiene programado para el día viernes 16 de julio de 2021, para dar inicio a la ejecución de la obra para el día lunes 26 de julio de 2021.						
						Sanitarios				2	26.97													
						Cubiculo				3	22.32													
						Áreas comunes				1	464.92													
						Otros				4	83.65													
						TOTAL				20	1,299.94													
3	Equipamiento para el Laboratorio LV-500 de Química y Ciencias Básicas, Unidad Obregón Campus Nainari.		X				\$ 1,562,541.27	\$ -		MESA ISLA	8							Se dio inicio al proceso de contratación, el cual se lleva a cabo por medio de licitación pública.						
						MESA A MURO				4														
						ALACENA				2														
						VITRINA				10														
						CAMPANA				4														
						BANCO				96														
						TOTAL				124	-													
						\$19,562,541.27	\$0.00	\$0.00																

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio 2021

FECHA DE CORTE: 30/06/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras para el Edificio de Aulas A-200, Unidad Obregón Campus Centro.





ITSON
Educar para
Trascender

Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACION

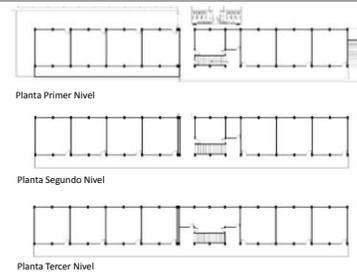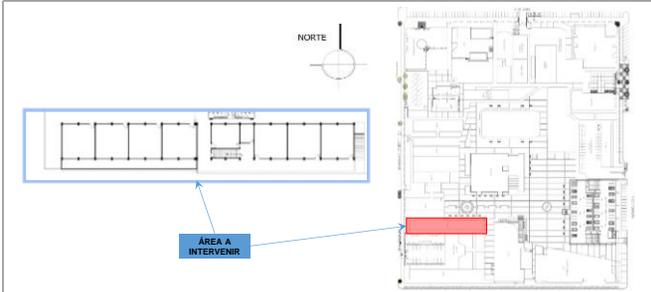


Referencia de fotos en croquis


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

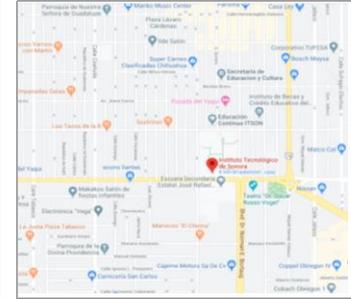

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior / Pasillo Norte


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Interior de laboratorio



F4: Interior / Pasillo Sur



F5: Interior de laboratorio

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alfonso Islas Escalante
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio 2021

FECHA DE CORTE: 30/06/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras para el Laboratorio LV-200 de Veterinaria, Unidad Obregón Campus Nainari.




Educación para Trascender


Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ÁREA A INTERVENIR

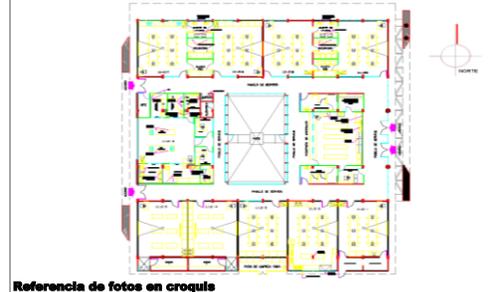


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Fachada posterior


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Acceso / Lobby



F4: Pasillo de acceso a salas



F5: Interior Laboratorio de rehabilitación física

Dr. Jesús Hector Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Rodríguez Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio_2021

FECHA DE CORTE: 30/06/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: Equipamiento para el Laboratorio LV-500 de Química y Ciencias Básicas, Unidad Obregón Campus Nainari.





Educación para Trascender

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

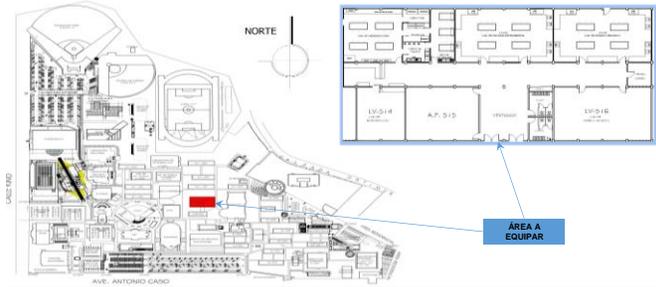

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Fachada posterior


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Acceso / Lobby



F4: Pasillo de acceso a salas



F5: Interior Laboratorio de rehabilitación física

Dr. Jesús Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina de los Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
