

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 09/01/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Instituto Tecnológico de Sonora

Entidad federativa: Sonora

Clave 911: 26MSU023H

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: 644 410 09 00 Ext. 2906 y 644 410 09 06 Directo
Correo electrónico: nrivos@itson.edu.mx

Nombre: Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Teléfono: 644 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y 644 410 09 15 Directo
Correo electrónico: rtamayo@itson.edu.mx



Educación para Trascender

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Main data table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAMI, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado (A), CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Monto ejercido (D), Remanente (E) =B-D, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Observaciones, Reingreso a la TESOFE, Actas.

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Dr. Jesús Hernández López
Rector

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 09/01/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:


Adecuaciones y Mejoras del Edificio AG-200 de Servicios Académicos y Estudiantiles, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.



ITSON
Educar para
Trascender

Porcentaje de avance

95.0%

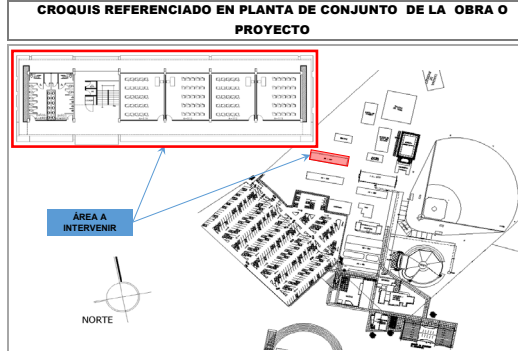

Dirección Postal: Carretera al Aeropuerto Km 3, C.P. 85400, Guaymas, Sonora, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior

Observaciones :
Colocación de pisos cerámicos, aplicación de pisos epoxicos, suministros e instalación de puertas y ventanas, aplanados en muros interiores y exteriores, fabricación de plafones, pintura en interiores y exteriores, trabajos en fachadas.



F3: Pasillo Planta Alta



F4: Interior Laboratorio



F5: Cubiculos

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dra. Nidia Josefina Rios Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 09/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:


Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-700, de Biotecnología y Tecnología de Alimentos Unidad Obregón, Campus Náinari.



ITSON
Educar para Trascender


Porcentaje de avance

93.0%

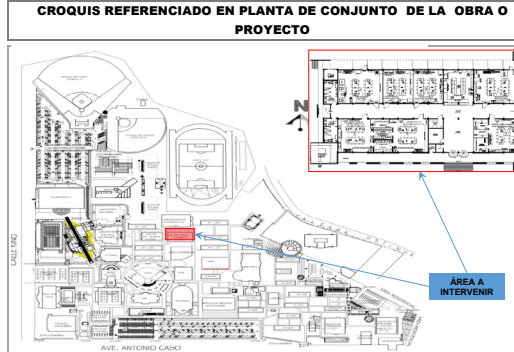

Dirección Postal: Antonio Caso S/N esq. con Lateral Kino, Fraccionamiento Villa ITSON, C.P. 85130, Ciudad Obregón, Sonora, México.

FOTOS

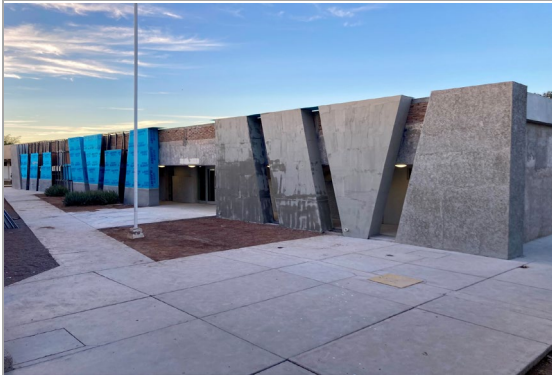

F1: Fachada principal



F2: Fachada Posterior

Observaciones :

Colocación de pisos cerámicos, aplicación de pisos epoxicos, suministros e instalación de puertas y ventanas, aplanados en muros interiores y exteriores, fabricación de plafones, pintura en interiores y exteriores, trabajos en fachadas.



F3: Vestibulo de acceso



F4: Laboratorio LV-715



F5: Pasillo interior

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dr. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Dr. Jesús Héctor Fernández López
Rector

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 09/01/2024


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-100, de Aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles, Unidad Navojoa, Campus Sur.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

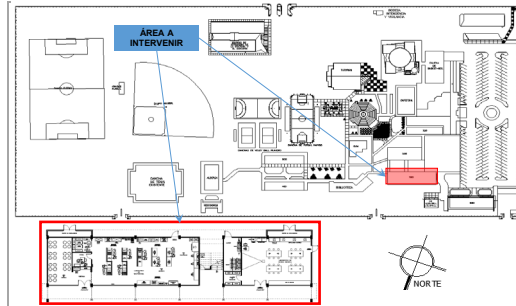

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Ramón Corona S/N esq. con Aguascalientes, Colonia ITSON, C.P. 85860, Navojoa, Sonora, México.



ITSON
Educar para Trascender

Porcentaje de avance

99.0%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior

Observaciones :
Colocación de pisos cerámicos, aplicación de pisos epoxicos, suministros e instalación de puertas y ventanas, aplanados en muros interiores y exteriores, fabricación de plafones, pintura en interiores y exteriores, construcción de fachadas y obra exterior.



F3: Pasillo Planta Alta



F4: Interior Laboratorio



F5: Interior Cubiculos

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector
